

体育館改築日記 ホームページ版

夏休みから本格的な改築工事が始まりました。体育館をすべて取り壊して、新たに新築するのではなく、骨格となる鉄柱部分だけ残して、それを利用して改築する工法で行われます。3月の完成、使用開始の予定です。



体育館の入口、トイレ、管理員室、用具を置くスペースだった「付帯」と呼ばれる部分を取り壊し、広げるための工事をしています。
〔9月3日撮影〕



騒音対策のため、体育館の周りに足場を組み、防音のシートで覆っています。体育館内の様子を見ることはできませんが、フローアの木材も撤去されているようです。

〔9月6日撮影〕



広い器具庫をつくるために付帯の部分を広げています。基礎を頑丈にするために、地面に鉄柱を埋め込んでいます。この作業車はとても大型の車なので、通行する他の車両に迷惑をかけないように、早朝に運転してきたようです。
〔9月17日撮影〕

定期テストの際の騒音対策のために日程を変更したことで、若干、予定より遅れ気味とのこと。3月には使用できるようになってほしいものです。休日を返上し、また暗くなくても作業いただいています。感謝です。



クレーン車で屋根の部分の鉄筋やその他重量のあるものを運び入れています。(9/29)




屋根をはがして、鉄筋の部分のペンキの塗り直しや補修をしています。(9/30)



付帯設備の部分を広げています。広い倉庫になります。基礎をしっかりと固めています。
(10/11)



基礎をしっかり築いて、掘り起こした土を埋め戻しています。(11/4)

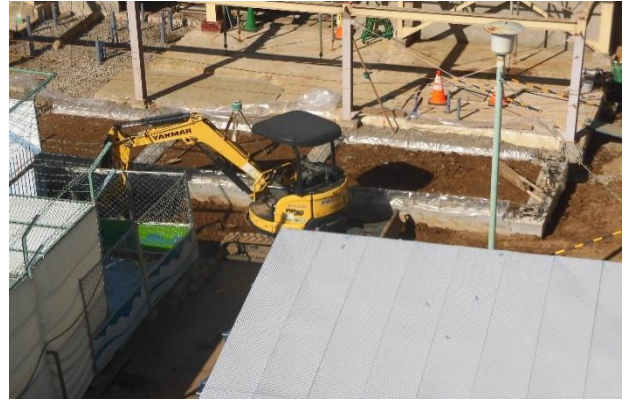

屋根の工事です。左は断熱材？を敷き詰めているのでしょうか？右は屋根の部分が完成したようです。(12/3)



付帯設備（倉庫等）の部分の拡張の工事です。屋根が完成しました。(1/11)



校舎から体育館への渡り廊下の工事です。基礎をしっかり築いています。(1/25)

完成は、3月末の予定です。卒業式と合唱コンクールの日には工事を中断して、使用します。建物の外回りはほとんど完成したようです。？現在は内装工事が行われているようです。完成が楽しみです。
