

上菅田笹の丘小学校建替工事 8月の施工状況

上菅田笹の丘小学校の児童の皆様、保護者の皆様、地域の皆様、このたびは、新校舎の建設が大幅に遅れてしまったことを心から深くお詫び申し上げます。

8月は先月に引き続き、令和5年10月23日の完成に向けて工事が進められています。

1 今月の主な工事


【校舎棟】外装工事、内装工事、外構工事

※電気、空調、給排水の各設備工事は、機器、配管、配線の取付け工事中です。

【体育館棟】【コミュニティハウス棟】内装工事、外構工事

※電気、空調、給排水の各設備工事は、機器、配管、配線の取付け工事中です。

2 工事写真（令和5年8月撮影）

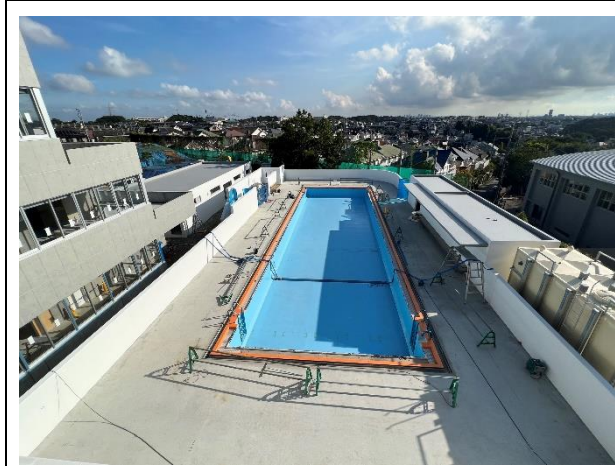

【プール】左官・塗装工事（壁・床等）



【校舎棟】外装・内装工事



【校舎棟】中庭外構工事



【校舎棟】3階床タイル工事

3 来月（令和5年9月）の工事予定

【校舎棟】内装工事、外構工事

※電気、空調、給排水の各設備工事は、機器、配管、配線の取付け工事中です。

【体育館棟】【コミュニティハウス棟】外構工事

※電気、空調、給排水の各設備工事は、機器、配管、配線の取付け工事中です。
